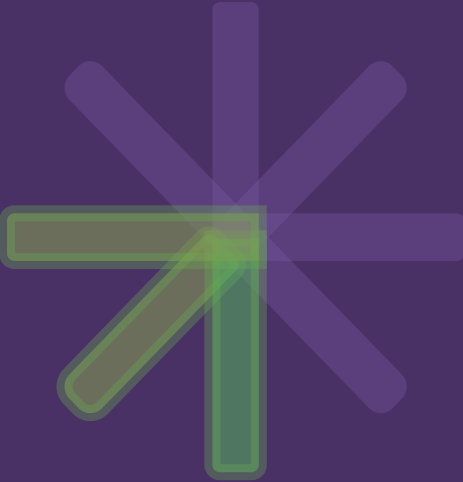


تخطيط المشاريع وجدولتها باستخدام Primavera P6 و MS Project

14 - 18 Feb 2027
النهاية





تخطيط المشاريع وجدولتها باستخدام Project MS و P6 Primavera

المرجع: 1407_3364 التاريخ: 18 Feb 2027 - 14 الموقع: النهاية الرسوم: GBP 4700

تخطيط المشاريع وجدولتها باستخدام Project MS و P6 Primavera دورة عملية في الجدولة مدتها خمسة أيام يقدمها مركز مارس للتدريب في مراكزه في لندن ودبي والدوحة ومسقط وكوالالمبور وهي مصممة لمخططي المشاريع ومجدولها ومتخصصي ضوابط المشاريع ومديري المشاريع الذين يحتاجون إلى بناء جداول زمنية قابلة للدفاع عنها باستخدام النواتج المنتشرة في القطاع.

الجدول الزمني هو أكثر وثيقة تخضع للتحقيق في أي مشروع كبير. فالرعاة يعترضون عليه، والمقاولون يتنازعون حوله، والمحامون يستشهدون به في النزاعات، وفرق التنفيذ تعمل به. وبناء جدول موثوق مزيج من المنهجية والانضباط وإتقان النداء. وتغطي هذه الدورة العناصر الثلاثة، مع التركيز على النواتج الهيمتين على السوق: Project MS و P6 Primavera.

على مدى خمسة أيام مركزة، ستعمل على منهجية الجدولة، ثم تبني جداول حقيقية وتديرها في Project MS و P6 Primavera معاً، ثم تتعلم كيف تفحص جدول جهة أخرى بحكم مهني رفيع. ويقدم الدورة كبار المخططين وقادة ضوابط المشاريع. وهي برنامج من إعداد مارس وليست شهادة صادرة عن أي مزود برمجيات.

ما الذي ستتعلمه

بحلول نهاية هذا البرنامج ستكون قادراً على:

- تطبيق مبادئ جدولة المسار الحرج على مشاريع واقعية.
- بناء جدول زمني للمشروع من هيكل تجزئة العمل حتى الخطة الممتدة كخط أساس.
- استخدام P6 Primavera لبناء الجدول الزمني واعتماد وتحديثه.
- استخدام Project MS لبناء الجدول الزمني واعتماد وتحديثه.
- تطبيق قياس التقدم والقيمة المكتسبة على جدول زمني قيد التشغيل.
- إجراء تحليل مخاطر الجدول الزمني على جدول في P6 Primavera.
- فحص جدول المقاول وتحديد أنماط التلاعب الشائعة فيه.
- إنتاج تقارير ولوحات معلومات للجدول الزمني تستخدمها الإدارة العليا فعلاً.
- بناء خطة تطوير شخصية في مجال الجدولة.

كيف ستستفيد

ستفاد باتقان عملي لنادي Project MS و P6 Primavera مدعوماً بالمنهجية التي تقوم عليها الجدولة، وشهادة إتمام من مارس.

ستكسب مؤسستك مخططاً أو مدير مشاريع يبني جداول قابلة للدفاع عنها، ويدافع عنها تحت التحقيق، ويوفر بيانات استشرافية للجدول الزمني تستطيع الإدارة العليا التصرف بناءً عليها.



لن هذا البرنامج

صمّم هذا البرنامج لمتخصصي التنفيذ والتخطيط، ومنهم:

- مخططو المشاريع وكبار المخططين
- مداولو المشاريع في قطاعات التشييد و EPC والبنية التحتية
- مديرو ضوابط المشاريع ومهندسو ضوابط المشاريع
- مديرو المشاريع الذين يتولون جداولهم الزمنية بأنفسهم
- مديرو ومحللو مكاتب إدارة المشاريع الذين يحافظون على جداول المحفظة
- مسؤولو إدارة العقود الذين يراجعون جداول المقاولين
- مديرو الهندسة المسؤولون عن التنفيذ وفق الجدول الرئيسي

الحد الأدنى للمستوى الوظيفي هو مخطط أو مدير مشاريع ذو خبرة.
